

# كروت مشروعات المراكز التكنولوجية

جهود التنمية في محافظة الشرقية

2022-2014

---

ص 1111-1121

## كارت المشروع رقم (١) - (مجتمع مدني)

البيانات الأساسية للمشروع (مراكز تكنولوجية بالوحدات المحلية)



اسم المشروع	انشاء عدد ٦ مراكز تكنولوجية بالوحدات المحلية برئاسة مركز ومدينة ههيا
جهة تمويل المشروع	مجهودات ذاتية (مجتمع مدني) ديوان عام المحافظة
الوزارة التابع لها المشروع	وزارة التنمية المحلية
جهة الولاية للأرض المقام عليها المشروع	مركز ومدينة ههيا
جهة الإشراف	مركز ومدينة ههيا
الشركة المنفذة	الوحدات المحلية بمركز ومدينة ههيا
استشاري المشروع (مالك)	مركز ومدينة ههيا
استشاري المشروع (مقاول)	مركز ومدينة ههيا
المكونات التفصيلية ووصف المشروع	عدد ٦ مراكز تكنولوجية مكونه من ساحات انتظار بمتوسط ٥٠ متر وعدد ٥ شبابيك تأدية خدمات
مدة تنفيذ المشروع	شهر
تاريخ البدء	٢٠٢٢/١
تاريخ الانتهاء التعاقدى	٢٠٢٢/٢
تاريخ الانتهاء الفعلي	٢٠٢٢/٢
القيمة التقديرية للمشروع	١ مليون
قيمة التجاوز	لا يوجد
القيمة الإجمالية	٦ مليون (شاملة قيمة الارض)

### موقف المصادر الأساسية للمشروع

موقف الربط علي المرافق الأساسية	طرق <input checked="" type="checkbox"/>	صرف <input checked="" type="checkbox"/>	مياه <input checked="" type="checkbox"/>	كهرباء <input checked="" type="checkbox"/>
دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية)				
محضر الإستلام الإبتدائي	تم الاستلام والتشغيل			
الشهادات المعتمدة للمشروع	لا يوجد			
الهدف من المشروع	تقديم الخدمات الحكومية بطريقه مميكنه وفصل مقدم الخدمة عن مؤديها			
عدد العمالة بالمشروع	عمالة مباشرة	عمالة مباشرة		
	١٥	١٥		
رأي المحافظ (نوع الإفتتاح)				
إعتماد المحافظ				

## كارت المشروع رقم (٢) - (مجتمع مدني)

### البيانات الأساسية للمشروع (مراكز تكنولوجية بالوحدات المحلية)



اسم المشروع	انشاء عدد ١٥ مركز تكنولوجي بالوحدات المحلية برئاسة مركزي منيا القمح و مشتول السوق
جهة تمويل المشروع	مجهودات ذاتية (مجتمع مدني) ديوان عام المحافظة
الوزارة التابع لها المشروع	وزارة التنمية المحلية
جهة الولاية للأرض المقام عليها المشروع	مركز ومدينة منيا القمح و مشتول السوق
جهة الإشراف	رئاسة مركز ومدينة ههيا
الشركة المنفذة	الوحدات المحلية مركزي منيا القمح و مشتول السوق
استشاري المشروع (مالك)	مركزي منيا القمح و مشتول السوق
استشاري المشروع (مقاول)	مركزي منيا القمح و مشتول السوق
المكونات التفصيلية ووصف المشروع	عدد ١٥ مراكز تكنولوجية مكونه من ساحات انتظار بمتوسط ٥٠ متر وعدد ٥ شبابيك تأدية خدمات
مدة تنفيذ المشروع	شهر
تاريخ البدء	٢٠٢٢/٣
تاريخ الانتهاء التعاقدى	٢٠٢٢/٤
تاريخ الانتهاء الفعلي	٢٠٢٢/٤
القيمة التقديرية للمشروع	٥٠٠ الف
قيمة التجاوز	لايوجد
القيمة الإجمالية	١ مليون (شاملة قيمة الارض)

### موقف المصادر الأساسية للمشروع

كهرباء	مياه	صرف	طرق	موقف الربط علي المرافق الأساسية
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية)
-	-	-	-	محضر الإستلام الإبتدائي
تم الاستلام والتشغيل	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	الشهادات المعتمدة للمشروع
تقديم الخدمات الحكومية بطريقه مميكنه وفصل مقدم الخدمة عن مؤديها	عمالة مباشرة	عمالة غير مباشرة	عمالة غير مباشرة	الهدف من المشروع
٥٠	١٢٠	٥٠	٥٠	عدد العمالة بالمشروع
				رأي المحافظ (نوع الإفتتاح)
				إعتماد المحافظ

كارت المشروع رقم (٣) - (مجتمع مدني)  
البيانات الأساسية للمشروع (مراكز تكنولوجية وحدات المحلية)



اسم المشروع	انشاء عدد ١٧ مركز تكنولوجي بالوحدات المحلية برناسة مركز أبو كبير و الابراهيمية و كفر صقر
جهة تمويل المشروع	مجهودات ذاتيه (مجتمع مدني) ديوان عام المحافظة
الوزارة التابع لها المشروع	وزارة التنمية المحلية
جهة الولاية للأرض المقام عليها المشروع	مركز ومدينة ههيا
جهة الإشراف	مراكز أبو كبير و الابراهيمية و كفر صقر
الشركة المنفذة	الوحدات المحلية بمركز ومدينة أبو كبير و الابراهيمية و كفر صقر
استشاري المشروع (مالك)	قسم المشروعات برناسة مركز أبو كبير و الابراهيمية و كفر صقر
استشاري المشروع (مقاول)	قسم المشروعات برناسة مركز أبو كبير و الابراهيمية و كفر صقر
المكونات التفصيلية ووصف المشروع	عدد ١٧ مراكز تكنولوجية مكونه من ساحات انتظار بمتوسط ٥٠ متر وعدد ٥ شبابيك تأدية خدمات
مدة تنفيذ المشروع	شهرين
تاريخ البدء	٢٠٢٢/٤
تاريخ الانتهاء التعاقدى	٢٠٢٢/٦
تاريخ الانتهاء الفعلي	٢٠٢٢/٦
القيمة التقديرية للمشروع	٢٥٠ الف
قيمة التجاوز	لا يوجد
القيمة الإجمالية	٩٠٠ الف (شاملة قيمة الارض)

موقف المصادر الأساسية للمشروع

كهرباء	مياه	صرف	طرق	موقف الربط علي المرافق الأساسية
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	موقف الربط علي المرافق الأساسية
دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية)				دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية)
تم الاستلام والتشغيل				محضر الإستلام الإبتدائي
لا يوجد				الشهادات المعتمدة للمشروع
تقديم الخدمات الحكومية بطريقه مميكنه وفصل مقدم الخدمة عن مؤديها				الهدف من المشروع
عمالة مباشرة	عمالة مباشرة	عدد العمالة بالمشروع		
٩٠	٢١٠	عدد العمالة بالمشروع		
رأي المحافظ (نوع الإفتتاح)				رأي المحافظ (نوع الإفتتاح)
إعتماد المحافظ				إعتماد المحافظ



كارت المشروع رقم (٤) - (مجتمع مدني)  
البيانات الأساسية للمشروع (مراكز تكنولوجية)



اسم المشروع	انشاء عدد ١٣ مركز تكنولوجي بالوحدات المحلية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق
جهة تمويل المشروع	مجهودات ذاتية (مجتمع مدني) ديوان عام المحافظة
الوزارة التابع لها المشروع	وزارة التنمية المحلية
جهة الولاية للأرض المقام عليها المشروع	مركز ومدينة الزقازيق
جهة الإشراف	مركز ومدينة الزقازيق
الشركة المنفذة	الوحدات المحلية بمركز ومدينة الزقازيق
استشاري المشروع (مالك)	مركز ومدينة الزقازيق
استشاري المشروع (مقاول)	مركز ومدينة الزقازيق
المكونات التفصيلية ووصف المشروع	عدد ١٣ مراكز تكنولوجية مكونه من ساحات انتظار بمتوسط ٥٠ متر وعدد ٥ شبابيك تأدية خدمات
مدة تنفيذ المشروع	شهر
تاريخ البدء	٢٠٢٢/٣
تاريخ الانتهاء التعاقدى	٢٠٢٢/٤
تاريخ الانتهاء الفعلي	٢٠٢٢/٤
القيمة التقديرية للمشروع	١,٥ مليون
قيمة التجاوز	لا يوجد
القيمة الإجمالية	٦ مليون (شاملة قيمة الارض)

موقف المصادر الأساسية للمشروع

كهرباء	مياه	صرف	طرق	موقف الربط علي المرافق الأساسية
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية)
تم الاستلام والتشغيل				محضر الإستلام الإبتدائي
لا يوجد				الشهادات المعتمدة للمشروع
تقديم الخدمات الحكومية بطريقه مميكنه وفصل مقدم الخدمة عن مؤديها				الهدف من المشروع
عمالة مباشرة	عمالة مباشرة	عدد العمالة بالمشروع		
٨٠	١١٥			
				رأي المحافظ (نوع الإفتتاح)
				إعتماد المحافظ

كارت المشروع رقم (٥) - (حكومي)  
البيانات الأساسية للمشروع (مراكز تكنولوجية)



اسم المشروع	انشاء المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين برئاسة حي أول
جهة تمويل المشروع	وزارة التنمية المحلية
الوزارة التابع لها المشروع	وزارة التنمية المحلية
جهة الولاية للأرض المقام عليها المشروع	مركز الزقازيق
جهة الإشراف	قسم المشروعات برئاسة حي أول الزقازيق
الشركة المنفذة	شركة عيد المعبود لاعمال المقاولات
استشاري المشروع (مالك)	قسم المشروعات برئاسة حي أول الزقازيق
استشاري المشروع (مقاول)	ساحة انتظار مواطنين بمساحة ٢٠ متر و عدد ٩ شبك تادية خدمة وغرفة مدير المركز ومشرفي النظام
المكونات التفصيلية ووصف المشروع	٣ شهر
مدة تنفيذ المشروع	٢٠١٤ / ١٠
تاريخ البدء	٢٠١٥ / ١
تاريخ الانتهاء التعاقدى	٢٠١٥ / ١
تاريخ الانتهاء الفعلي	٢٥١ الف
القيمة التقديرية للمشروع	لايوجد
قيمة التجاوز	٤٠٠ الف
القيمة الإجمالية	

موقف المصادر الأساسية للمشروع

موقف الربط علي المرافق الأساسية	طرق <input checked="" type="checkbox"/>	صرف <input checked="" type="checkbox"/>	مياه <input checked="" type="checkbox"/>	كهرباء <input checked="" type="checkbox"/>
دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية)	تم التسليم بالموعد المحدد وتم التشغيل			
محضر الإستلام الإبتدائي	لا يوجد			
الشهادات المعتمدة للمشروع	تقديم الخدمات الحكومية بطريقه مميكنة و فصل مقدم الخدمة عن مؤديها			
الهدف من المشروع	عدد العمالة بالمشروع			
رأي المحافظ (نوع الإفتتاح)	عمالة مباشرة ١٥			
إعتماد المحافظ	عمالة مباشرة ١٥			

كارت المشروع رقم (٦) - (حكومي)  
البيانات الأساسية للمشروع (مراكز تكنولوجية)




اسم المشروع	انشاء المركز برناسة مركز ومدينة ابوحماد التكنولوجي لخدمة المواطنين
جهة تمويل المشروع	وزارة التنمية المحلية
الوزارة التابع لها المشروع	وزارة التنمية المحلية
جهة الولاية للأرض المقام عليها المشروع	مركز ابوحماد
جهة الإشراف	مركز ومدينة ابوحماد
الشركة المنفذة	
استشاري المشروع (مالك)	مركز ومدينة ابوحماد
استشاري المشروع (مقاول)	
المكونات التفصيلية ووصف المشروع	ساحة انتظار مواطنين بمساحة ٣٠ متر و عدد ٧ شبكات تادية خدمة وغرفة مدير المركز ومشرفي النظام بمساحة ١٦ متر
مدة تنفيذ المشروع	٦ شهور
تاريخ البدء	٢٠١٣/١١
تاريخ الانتهاء التعاقدى	٢٠١٤/٥
تاريخ الانتهاء الفعلي	٢٠١٤/٥
القيمة التقديرية للمشروع	٦١٣ الف جنيه
قيمة التجاوز	لا يوجد
القيمة الإجمالية	٨٠٠ الف جنيهها(شاملة قيمة الأرض)

موقف المصادر الأساسية للمشروع

موقف الربط علي المرافق الأساسية	طرق	صرف	مياه	كهرباء
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية)				
تم التسليم بالموعد المحدد وتم التشغيل				
لا يوجد				
تقديم الخدمات الحكومية بطريقه مميكنة و فصل مقدم الخدمة عن مؤديها				
عدد العمالة بالمشروع				
رأى المحافظ (نوع الإفتتاح)				
إعتماد المحافظ				
عمالة مباشرة		عمالة غير مباشرة		
١٢		١٥		



كارت المشروع رقم (٧) - (حكومي)  
البيانات الأساسية للمشروع (مراكز تكنولوجية)

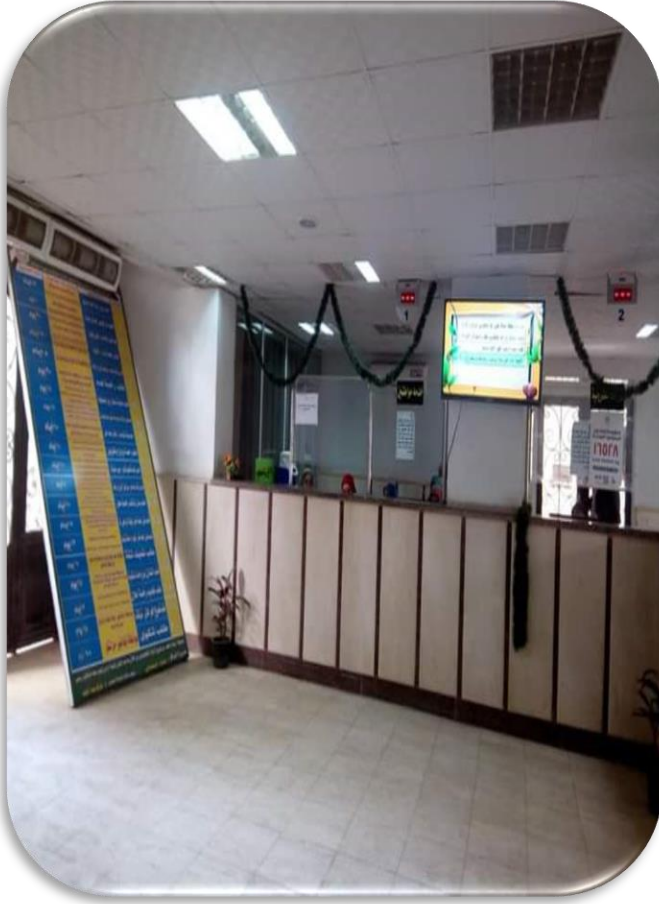

اسم المشروع	انشاء المركز التكنولوجي برئاسة مركز ومدينة بلبيس
جهة تمويل المشروع	وزارة التنمية المحلية
الوزارة التابع لها المشروع	وزارة التنمية المحلية
جهة الولاية للأرض المقام عليها المشروع	مركز بلبيس
جهة الإشراف	مركز ومدينة بلبيس
الشركة المنفذة	
استشاري المشروع (مالك)	مركز ومدينة بلبيس
استشاري المشروع (مقاول)	
المكونات التفصيلية ووصف المشروع	ساحة انتظار مواطنين بمساحة ٨٠ متر و عدد ١٠ شبك تادية خدمة وغرفة مدير المركز ومشرفي النظام
مدة تنفيذ المشروع	٦ شهور
تاريخ البدء	٢٠١٣/١١
تاريخ الانتهاء التعاقدى	٢٠١٤/٥
تاريخ الانتهاء الفعلي	٢٠١٤/٥
القيمة التقديرية للمشروع	٣٠٠ الف جنيه
قيمة التجاوز	لا يوجد
القيمة الإجمالية	٣٠٠ الف جنيها

موقف المصادر الأساسية للمشروع

موقف الربط علي المرافق الأساسية	طرق	صرف	مياه	كهرباء
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية)	تم التسليم بالموعد المحدد وتم التشغيل			
محضر الإستلام الإبتدائي	لا يوجد			
الشهادات المعتمدة للمشروع	تقديم الخدمات الحكومية بطريقة مميكنة و فصل مقدم الخدمة عن مؤديها			
الهدف من المشروع	عدد العمالة بالمشروع			
رأي المحافظ (نوع الإفتتاح)	عمالة مباشرة			
إعتماد المحافظ	عمالة غير مباشرة			
	٢٠			
	١٥			



كارت المشروع رقم (٨) - (حكومي)  
البيانات الأساسية للمشروع (مراكز تكنولوجية)



اسم المشروع	انشاء مركز تكنولوجي بمدينة القناتيات
جهة تمويل المشروع	وزارة التنمية المحلية
الوزارة التابع لها المشروع	وزارة التنمية المحلية
جهة الولاية للأرض المقام عليها المشروع	مدينة القناتيات
جهة الإشراف	رئاسة مدينة القناتيات
الشركة المنفذة	عطية عبد ربه محمد الشوافي
استشاري المشروع (مالك)	رئاسة مدينة القناتيات
استشاري المشروع (مقاول)	
المكونات التفصيلية ووصف المشروع	ساحة انتظار مواطنين بمساحة ٥ متر و عدد ٨ شبك تادية خدمة وغرفة مدير المركز ومشرفي النظام
مدة تنفيذ المشروع	٦ أشهر
تاريخ البدء	٢٠١٤/١٢
تاريخ الانتهاء التعاقدى	٢٠١٥/٤
تاريخ الانتهاء الفعلي	٢٠١٥/٦
القيمة التقديرية للمشروع	١٠٧ الف
قيمة التجاوز	لا يوجد
القيمة الإجمالية	١٠٧ الف

موقف المصادر الأساسية للمشروع

موقف الربط علي المرافق الأساسية	طرق	صرف	مياه	كهرباء
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية)				
محضر الإستلام الإبتدائي		تم التسليم بالموعد المحدد وتم التشغيل		
الشهادات المعتمدة للمشروع		لا يوجد		
الهدف من المشروع : تقديم الخدمات الحكومية بطريقه مميكنة و فصل مقدم الخدمة عن مؤديها		تقديم الخدمات الحكومية بطريقه مميكنة و فصل مقدم الخدمة عن مؤديها		
عدد العمالة بالمشروع		عمالة مباشرة	عمالة غير مباشرة	
		٢٠	٢٠	
رأي المحافظ (نوع الإفتتاح)				
إعتماد المحافظ				

كارت المشروع رقم (٩) - (حكومي)

البيانات الأساسية للمشروع (مراكز تكنولوجية)



اسم المشروع	انشاء المركز التكنولوجي برئاسة مدينة القرين
جهة تمويل المشروع	وزارة التنمية المحلية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
الوزارة التابع لها المشروع	وزارة التنمية المحلية
جهة الولاية للأرض المقام عليها المشروع	أملاك دولة (أملاك مدينة القرين)
جهة الإشراف	قسم المشروعات برئاسة مدينة القرين
الشركة المنفذة	شركة النور للمقاولات
استشاري المشروع (مالك)	قسم المشروعات برئاسة مدينة القرين
استشاري المشروع (مقاول)	
المكونات التفصيلية ووصف المشروع	ساحة انتظار مواطنين بمساحة ٣٠ متر و عدد ١٠ شبك تادية خدمة وغرفة مدير المركز ومشرفي النظام بمساحة ١٦ متر
مدة تنفيذ المشروع	١٢ شهر
تاريخ البدء	٢٠١٤/١٢
تاريخ الانتهاء التعاقدى	٢٠١٥/١٢
تاريخ الانتهاء الفعلي	٢٠١٥/١٢
القيمة التقديرية للمشروع	٣١٨ الف
قيمة التجاوز	لا يوجد
القيمة الإجمالية	٣١٨ الف

موقف المصادر الأساسية للمشروع

موقف الربط علي المرافق الأساسية	طرق <input checked="" type="checkbox"/>	صرف <input checked="" type="checkbox"/>	مياه <input checked="" type="checkbox"/>	كهرباء <input checked="" type="checkbox"/>
دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية)	تم التسليم بالموعد المحدد وتم التشغيل لا يوجد			
محضر الإستلام الإبتدائي	تقديم الخدمات الحكومية بطريقه مميكنة و فصل مقدم الخدمة عن مؤديها			
الشهادات المعتمدة للمشروع	الهدف من المشروع : تقديم الخدمات الحكومية بطريقه مميكنة و فصل مقدم الخدمة عن مؤديها			
عدد العمالة بالمشروع	عمالة مباشرة	عمالة غير مباشرة		
رأي المحافظ (نوع الإفتتاح)	١٥	٢٠		
إعتماد المحافظ				

كارت المشروع رقم (١٠) - (حكومي)  
البيانات الأساسية للمشروع (مراكز تكنولوجية)



اسم المشروع	انشاء المركز التكنولوجي
جهة تمويل المشروع	وزارة التنمية المحلية
الوزارة التابع لها المشروع	وزارة التنمية المحلية
جهة الولاية للأرض المقام عليها المشروع	مركز الابراهيمية
جهة الإشراف	قسم المشروعات برئاسة مركز ومدينة الابراهيمية
الشركة المنفذة	المكتب الفني للبناء والتعمير
استشاري المشروع (مالك)	قسم المشروعات برئاسة مركز ومدينة الابراهيمية
استشاري المشروع (مقاول)	ساحة انتظار مواطنين بمساحة ١٠٠ متر و عدد ٩ شبك تأدية خدمة وغرفة مدير المركز
المكونات التفصيلية ووصف المشروع	مدة تنفيذ المشروع
	١٢ شهر
	تاريخ البدء
	٢٠١٦/٦
	تاريخ الانتهاء التعاقدى
	٢٠١٧/٦
	تاريخ الانتهاء الفعلي
	٢٠١٧/٦
	القيمة التقديرية للمشروع
	٤٢٧ الف
	قيمة التجاوز
	لا يوجد
	القيمة الإجمالية
	٤٢٧ الف

موقف المصادر الأساسية للمشروع

موقف الربط علي المرافق الأساسية	طرق	صرف	مياه	كهرباء
دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
محضر الإستلام الإبتدائي				
الشهادات المعتمدة للمشروع				
الهدف من المشروع				
عدد العمالة بالمشروع				
رأي المحافظ (نوع الإفتتاح)				
إعتماد المحافظ				
			عمالة مباشرة ٢٥	عمالة غير مباشرة ٥
				تم التسليم بالموعد المحدد وتم التشغيل لا يوجد
				تقديم الخدمات الحكومية بطريقه ممكنة و فصل مقدم الخدمة عن مؤديها

كارت المشروع رقم (١١) - (حكومي)  
البيانات الأساسية للمشروع (مراكز تكنولوجية)



اسم المشروع	انشاء المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمشتول السوق
جهة تمويل المشروع	وزارة التنمية المحلية
الوزارة التابع لها المشروع	وزارة التنمية المحلية
جهة الولاية للأرض المقام عليها المشروع	مشتول السوق
جهة الإشراف	قسم المشروعات برئاسة مركز ومدينة مشتول السوق
الشركة المنفذة	
استشاري المشروع (مالك)	قسم المشروعات برئاسة مركز ومدينة مشتول السوق
استشاري المشروع (مقاول)	
المكونات التفصيلية ووصف المشروع	ساحة انتظار مواطنين بمساحة ٢٠٠ متر و عدد ٩ شبكات تأدية خدمة وغرفة مدير المركز
مدة تنفيذ المشروع	سنة
تاريخ البدء	٢٠١٥/٦
تاريخ الانتهاء التعاقدى	٢٠١٦/٦
تاريخ الانتهاء الفعلي	٢٠١٦/٦
القيمة التقديرية للمشروع	٨٥٧ الف
قيمة التجاوز	لا يوجد
القيمة الإجمالية	١ مليون (شاملة قيمة الأرض)

موقف المصادر الأساسية للمشروع

كهرباء	مياه	صرف	طرق	موقف الربط علي المرافق الأساسية
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية)				
تم التسليم بالموعد المحدد وتم التشغيل				
لا يوجد				
تقديم الخدمات الحكومية بطريقه مميكنة و فصل مقدم الخدمة عن مؤديها				
الهدف من المشروع				
عدد العمالة بالمشروع				
رأي المحافظ (نوع الإفتتاح)				
إعتماد المحافظ				
عمالة غير مباشرة	عمالة مباشرة			
١٠	٣٠			



كارت المشروع رقم (١٢) - (حكومي)

البيانات الأساسية للمشروع (مراكز تكنولوجية برناسة مركز ومدينة كفر صقر)



اسم المشروع	انشاء المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بكفر صقر
جهة تمويل المشروع	وزارة التنمية المحلية
الوزارة التابع لها المشروع	وزارة التنمية المحلية
جهة الولاية للأرض المقام عليها المشروع	مركز كفر صقر
جهة الإشراف	قسم المشروعات برناسة مركز ومدينة كفر صقر
الشركة المنفذة	
استشاري المشروع (مالك)	قسم المشروعات برناسة مركز ومدينة كفر صقر
استشاري المشروع (مقاول)	
المكونات التفصيلية ووصف المشروع	ساحة انتظار مواطنين بمساحة ١٧٠ متر و عدد ٩ شباك تادية خدمة وغرفة مدير المركز
مدة تنفيذ المشروع	٥ اشهر
تاريخ البدء	٢٠٢١/١١
تاريخ الانتهاء التعاقدى	٢٠٢٢/٤
تاريخ الانتهاء الفعلي	٢٠٢٢/٤
القيمة التقديرية للمشروع	٢ مليون
قيمة التجاوز	لا يوجد
القيمة الإجمالية	٤ مليون (شاملة قيمة الارض)

موقف المصادر الأساسية للمشروع

كهرباء	مياه	صرف	طرق	موقف الربط علي المرافق الأساسية
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية)				
تم التسليم بالموعد المحدد وتم التشغيل				محضر الإستلام الإبتدائي
لا يوجد				الشهادات المعتمدة للمشروع
تقديم الخدمات الحكومية بطريقه مميكنة و فصل مقدم الخدمة عن مؤديها				الهدف من المشروع
عمالة غير مباشرة		عمالة مباشرة		عدد العمالة بالمشروع
١٥		٤٠		
رأي المحافظ (نوع الإفتتاح)				
إعتماد المحافظ				

كارت المشروع رقم (١٣) - (حكومي)

البيانات الأساسية للمشروع (مراكز تكنولوجية برئاسة مركز ومدينة الحسينية)



اسم المشروع	انشاء المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين
جهة تمويل المشروع	وزارة التنمية المحلية
الوزارة التابع لها المشروع	وزارة التنمية المحلية
جهة الولاية للأرض المقام عليها المشروع	مركز ومدينة الحسينية
جهة الإشراف	رئاسة مركز ومدينة الحسينية
الشركة المنفذة	
استشاري المشروع (مالك)	رئاسة مركز ومدينة الحسينية
استشاري المشروع (مقاول)	
المكونات التفصيلية ووصف المشروع	ساحة انتظار مواطنين بمساحة ٣٠٠ متر وعدد ١٤ شباك تأدية خدمة وغرفة مدير المركز ومشرفي النظام بمساحة ٢٠ متر
مدة تنفيذ المشروع	٥ اشهر
تاريخ البدء	٢٠٢١/١١
تاريخ الانتهاء التعاقدى	٢٠٢٢/٤
تاريخ الانتهاء الفعلي	٢٠٢٢/٤
القيمة التقديرية للمشروع	٣ مليون
قيمة التجاوز	لا يوجد
القيمة الإجمالية	٥ مليون (شاملة قيمة الأرض)

موقف المصادر الأساسية للمشروع

كهرباء	مياه	صرف	طرق	موقف الربط علي المرافق الأساسية
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية)
				محضر الإستلام الإبتدائي
				الشهادات المعتمدة للمشروع
				الهدف من المشروع
				عدد العمالة بالمشروع
				رأي المحافظ (نوع الإفتتاح)
				إعتماد المحافظ

كارت المشروع رقم (١٤) - (حكومي)

البيانات الأساسية للمشروع (مراكز تكنولوجية برئاسة مدينة صان الحجر)



اسم المشروع	انشاء المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بصان الحجر
جهة تمويل المشروع	وزارة التنمية المحلية
الوزارة التابع لها المشروع	وزارة التنمية المحلية
جهة الولاية للأرض المقام عليها المشروع	مدينة صان الحجر
جهة الإشراف	رئاسة مدينة صان الحجر
الشركة المنفذة	
استشاري المشروع (مالك)	رئاسة مركز ومدينة الحسينية
استشاري المشروع (مقاول)	
المكونات التفصيلية ووصف المشروع	ساحة انتظار مواطنين بمساحة ١٠٠ متر و عدد ٧ شبك تادية خدمة وغرفة مدير المركز
مدة تنفيذ المشروع	سنتين
تاريخ البدء	٢٠١٥/٦
تاريخ الانتهاء التعاقدى	٢٠١٧/٦
تاريخ الانتهاء الفعلي	٢٠١٧/٦
القيمة التقديرية للمشروع	٥٧٤ الف
قيمة التجاوز	لا يوجد
القيمة الإجمالية	١ مليون (شاملة قيمة الارض)

موقف المصادر الأساسية للمشروع

كهرباء	مياه	صرف	طرق	موقف الربط علي المرافق الأساسية
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية)				
تم التسليم بالموعد المحدد وتم التشغيل				محضر الإستلام الإبتدائي
لا يوجد				الشهادات المعتمدة للمشروع
تقديم الخدمات الحكومية بطريقه مميكنة و فصل مقدم الخدمة عن مؤديها				الهدف من المشروع
عمالة مباشرة		عمالة مباشرة		عدد العمالة بالمشروع
٧		٢٥		
				رأي المحافظ (نوع الإفتتاح)
				إعتماد المحافظ

كارت المشروع رقم (١٥) - (حكومي)

البيانات الأساسية للمشروع (مراكز تكنولوجية برئاسة مركز ومدينة ديرب نجم)



اسم المشروع	انشاء المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين
جهة تمويل المشروع	وزارة التنمية المحلية
الوزارة التابع لها المشروع	وزارة التنمية المحلية
جهة الولاية للأرض المقام عليها المشروع	مركز ديرب نجم
جهة الإشراف	مركز ومدينة ديرب نجم
الشركة المنفذة	
استشاري المشروع (مالك)	مركز ومدينة ديرب نجم
استشاري المشروع (مقاول)	
المكونات التفصيلية ووصف المشروع	ساحة انتظار مواطنين بمساحة ٢٥٠ متر و عدد ١١ شباك تأدية خدمة وغرفة مدير المركز
مدة تنفيذ المشروع	سنة
تاريخ البدء	٢٠١٧/٤
تاريخ الانتهاء التعاقدى	٢٠١٨/٤
تاريخ الانتهاء الفعلى	٢٠١٨/٤
القيمة التقديرية للمشروع	٦٠٠ الف
قيمة التجاوز	لا يوجد
القيمة الإجمالية	١ مليون (شاملة قيمة الارض)

موقف المصادر الأساسية للمشروع

كهرباء	مياه	صرف	طرق	موقف الربط على المرافق الأساسية
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية)				
تم التسليم بالموعد المحدد وتم التشغيل				محضر الإستلام الإبتدائي
لا يوجد				الشهادات المعتمدة للمشروع
تقديم الخدمات الحكومية بطريقة ممكنة و فصل مقدم الخدمة عن مؤديها				الهدف من المشروع
عمالة غير مباشرة		عمالة مباشرة		عدد العمالة بالمشروع
١٥		٣٠		
				رأى المحافظ (نوع الإفتتاح)
				إعتماد المحافظ



كارت المشروع رقم (١٦) - (حكومي)

البيانات الأساسية للمشروع (مراكز تكنولوجية برئاسة مركز ومدينة ههيا)



اسم المشروع	انشاء المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بههيا
جهة تمويل المشروع	وزارة التنمية المحلية
الوزارة التابع لها المشروع	وزارة التنمية المحلية
جهة الولاية للأرض المقام عليها المشروع	أملاك دولة (أملاك مركز ومدينة ههيا)
جهة الإشراف	قسم المشروعات برئاسة مركز ومدينة ههيا
الشركة المنفذة	مكتب محمد جمال للمقاولات
استشاري المشروع (مالك)	قسم المشروعات برئاسة مركز ومدينة ههيا
استشاري المشروع (مقاول)	ساحة انتظار مواطنين بمساحة ١٠٠ متر و عدد ٧ شبك تأدية خدمة وغرفة مدير المركز
المكونات التفصيلية ووصف المشروع	
مدة تنفيذ المشروع	٣ شهور
تاريخ البدء	٢٠١٩/٨
تاريخ الانتهاء التعاقدى	٢٠١٩/١١
تاريخ الانتهاء الفعلي	٢٠١٩/١١
القيمة التقديرية للمشروع	٢٦٠ تاف
قيمة التجاوز	لا يوجد
القيمة الإجمالية	٢٦٠ الف

موقف المصادر الأساسية للمشروع

كهرباء	مياه	صرف	طرق	موقف الربط علي المرافق الأساسية
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية)
تم التسليم بالموعد المحدد وتم التشغيل				محضر الإستلام الإبتدائي
لا يوجد				الشهادات المعتمدة للمشروع
تقديم الخدمات الحكومية بطريقه مميكنة و فصل مقدم الخدمة عن مؤديها				الهدف من المشروع
عمالة غير مباشرة		عمالة مباشرة		عدد العمالة بالمشروع
١٢		٢٠		رأي المحافظ (نوع الإفتتاح)
				إعتماد المحافظ

كارت المشروع رقم (١٧) - (حكومي)

البيانات الأساسية للمشروع (مراكز تكنولوجية برئاسة حي ثاني الزقازيق)



اسم المشروع	وانشاء المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي ثان
جهة تمويل المشروع	وزارة التنمية المحلية
الوزارة التابع لها المشروع	وزارة التنمية المحلية
جهة الولاية للأرض المقام عليها المشروع	رئاسة حي ثاني الزقازيق
جهة الإشراف	رئاسة حي ثاني الزقازيق
الشركة المنفذة	شركة الهداية (رضوان إبراهيم)
استشاري المشروع (مالك)	رئاسة حي ثاني الزقازيق
استشاري المشروع (مقاول)	
المكونات التفصيلية ووصف المشروع	ساحة انتظار مواطنين بمساحة ١٠٠ متر و عدد ٧ شبكات تأدية خدمة وغرفة مدير المركز
مدة تنفيذ المشروع	خمسة أشهر
تاريخ البدء	٢٠١٨/١١
تاريخ الانتهاء التعاقدى	٢٠١٩/٤
تاريخ الانتهاء الفعلي	٢٠١٩/٥
القيمة التقديرية للمشروع	٦٦٣ الف
قيمة التجاوز	لا يوجد
القيمة الإجمالية	١ مليون (شاملة قيمة الأرض)

موقف المصادر الأساسية للمشروع

موقف الربط علي المرافق الأساسية	طرق	صرف	مياه	كهرباء
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية)	تم التسليم بالموعد المحدد وتم التشغيل	لا يوجد	تقديم الخدمات الحكومية بطريقه ممكنة و فصل مقدم الخدمة عن مؤديها	عدد العمالة بالمشروع
محضر الإستلام الإبتدائي	الشهادات المعتمدة للمشروع	الهدف من المشروع	عمالة مباشرة	٢٢
الهدف من المشروع	عدد العمالة بالمشروع	رأي المحافظ (نوع الإفتتاح)	عمالة غير مباشرة	١٥
إعتماد المحافظ				

كارت المشروع رقم (١٨) - (حكومي)

البيانات الأساسية للمشروع (مراكز تكنولوجية برئاسة مدينة منشأة ابو عمر)



اسم المشروع	انشاء المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمنشأة أبو عمر
جهة تمويل المشروع	وزارة التنمية المحلية
الوزارة التابع لها المشروع	وزارة التنمية المحلية
جهة الولاية للأرض المقام عليها المشروع	مدينة منشأة ابو عمر
جهة الإشراف	مدينة منشأة أبو عمر
الشركة المنفذة	
استشاري المشروع (مالك)	مدينة منشأة ابو عمر
استشاري المشروع (مقاول)	
المكونات التفصيلية ووصف المشروع	ساحة انتظار مواطنين بمساحة ١٠٠ متر و عدد ٧ شبكات تأدية خدمة وغرفة مدير المركز
مدة تنفيذ المشروع	خمسة أشهر
تاريخ البدء	٢٠١٨/١٢
تاريخ الانتهاء التعاقدى	٢٠١٩/٤
تاريخ الانتهاء الفعلي	٢٠١٩/٥
القيمة التقديرية للمشروع	٣٥٠ الف
قيمة التجاوز	لا يوجد
القيمة الإجمالية	٣٥٠ الف

موقف المصادر الأساسية للمشروع

كهرباء	مياه	صرف	طرق	موقف الربط علي المرافق الأساسية
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية)
				محضر الإستلام الإبتدائي
				الشهادات المعتمدة للمشروع
				الهدف من المشروع
				عدد العمالة بالمشروع
				رأي المحافظ (نوع الإفتتاح)
				إعتماد المحافظ

كارت المشروع رقم (١٩) - (حكومي)

البيانات الأساسية للمشروع (مراكز تكنولوجيا برئاسة مركز ومدينة أولاد صقر)



اسم المشروع	انشاء المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين باولاد صقر
جهة تمويل المشروع	وزارة التنمية المحلية
الوزارة التابع لها المشروع	وزارة التنمية المحلية
جهة الولاية للأرض المقام عليها المشروع	مركز ومدينة أولاد صقر
جهة الإشراف	مركز ومدينة أولاد صقر
الشركة المنفذة	محمد عزت عبدالعاطي
استشاري المشروع (مالك)	مركز ومدينة أولاد صقر
استشاري المشروع (مقاول)	مركز ومدينة أولاد صقر
المكونات التفصيلية ووصف المشروع	ساحة انتظار مواطنين بمساحة ١٠٠ متر و عدد ٧ شبك تأدية خدمة وغرفة مدير المركز ومشرفي النظام
مدة تنفيذ المشروع	ثلاث اشهر
تاريخ البدء	٢٠١٦/٣
تاريخ الانتهاء التعاقدى	٢٠١٦/٦
تاريخ الانتهاء الفعلي	٢٠١٦/٦
القيمة التقديرية للمشروع	٣٢٠ الف
قيمة التجاوز	لا يوجد
القيمة الإجمالية	٦٠٠ الف (شاملة قيمة الارض)

موقف المصادر الأساسية للمشروع

كهرباء	مياه	صرف	طرق	موقف الربط علي المرافق الأساسية
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية)				
تم التسليم بالموعد المحدد وتم التشغيل				محضر الإستلام الإبتدائي
لا يوجد				الشهادات المعتمدة للمشروع
تقديم الخدمات الحكومية بطريقه مميكنة و فصل مقدم الخدمة عن مؤديها				الهدف من المشروع
عمالة غير مباشرة		عمالة مباشرة		عدد العمالة بالمشروع
١٠		١٢		
رأي المحافظ (نوع الإفتتاح)				إعتماد المحافظ
